

Шикова Людмила

Тестовое задание: AI-агент проверки целевого использования льготных кредитов

1. Ключевые вопросы к заказчику и стейкхолдерам

№	Вопрос	Кому	Зачем	Риск, который закрываем
1	Каков точный объем и разнообразие тестовой выборки документов? Есть ли уже размеченный набор (Ground Truth) с известными ошибками?	Заказчик / Казначейство	Понять, на каких данных будем обучаться и тестироваться, зафиксировать критерии приемки.	Риск того, что MVP не пройдет приемку из-за отсутствия эталонных данных для сравнения.
2	Как формализованы правила льготных программ? Можно ли представить их в виде структурированного чек-листа (JSON/Таблица), а не только в виде PDF?	Юристы / Заказчик	Перевести субъективные правила в жесткие алгоритмы проверки и промпты для LLM.	Риск галлюцинаций LLM и невозможности гарантировать 100% проверку формальных признаков.
3	Какие требования СБ и ИТ-безопасности предъявляются к контуру пилота? Допустимо ли использование облачных LLM или нужен on-premise контур?	ИТ-департамент / СБ	Выбрать архитектурный стек и заложить время на согласование доступов.	Риск срыва сроков пилота из-за долгих согласований информационной безопасности.
4	Как сейчас идентифицируются авансовые платежи для пост-контроля? Есть ли реестр авансов, к которому можно привязать закрывающие документы?	Бухгалтерия / Казначейство	Спроектировать механику сопоставления «Оплата -> Закрывающий документ».	Риск невозможности реализовать пост-контроль без связки с учетной системой.
5	Какие расхождения в суммах/количестве считаются критичными, а какие допустимы (например, округление копеек, частичная поставка)?	Бухгалтерия / Казначейство	Настроить пороги срабатывания триггеров, чтобы избежать «спама» ложных тревог.	Риск потери доверия к системе из-за ложноположительных срабатываний на незначительных отклонениях.

6	Достаточно ли агенту проверять только факт наличия подписи/печати (визуально), или нужна проверка их действительности?	Юристы	Ограничить скоуп MVP. Проверка действительност и ЭП требует интеграций, которых нет в скоупе.	Риск завышенных ожиданий от бизнеса относительно юридической значимости проверки.
7	Какой процент кейсов со статусом «Требуется ручная проверка» является целевым для успеха пилота?	Руководитель процесса	Зафиксировать реалистичные метрики качества (Recall/Precision).	Риск того, что бизнес будет ждать 100% автоматизации, что недостижимо для LLM на старте.
8	Где физически будут хранить документы для пилота? (Сетевая папка, S3, локальный ПК?)	ИТ / Казначейство	Спроектировать механизм загрузки и хранения файлов в MVP.	Риск создания неудобного UX или проблем с доступом к файлам у серверной части.


2. Описание бизнес-процесса (TO BE)

Процесс: Первичная проверка пакета документов перед авансовым платежом с использованием AI-агента.


User Flow (Логика процесса)

1. Инициация: Специалист казначейства формирует пакет документов (Договор, Спецификация, Счет, УПД) и загружает их в веб-интерфейс AI-агента, выбирая из списка льготную программу.
2. Обработка (Backend): Система отправляет файлы в OCR-модуль. LLM извлекает сущности: суммы, даты, контрагентов, номенклатуру, признаки подписей/печатей.
3. Валидация (Правила): Агент сверяет извлеченные данные между собой и с правилами программы (комплектность, сроки, целевое назначение).
4. Принятие решения:
 - *Сценарий А (Всё чисто)*: Статус «Можно заявлять». Формируется краткий отчет.
 - *Сценарий Б (Критическая ошибка)*: Статус «Нельзя заявлять». Агент указывает причину (например, «Отсутствует спецификация»).
 - *Сценарий В (Неуверенность)*: Статус «Требуется ручная проверка». Кейс падает на Дашборд Руководителя.
5. Эскалация: Руководитель открывает спорный кейс, видит подсвеченные агентом места в документах и принимает финальное решение (одобрить / отклонить).

Схема бизнес-процесса

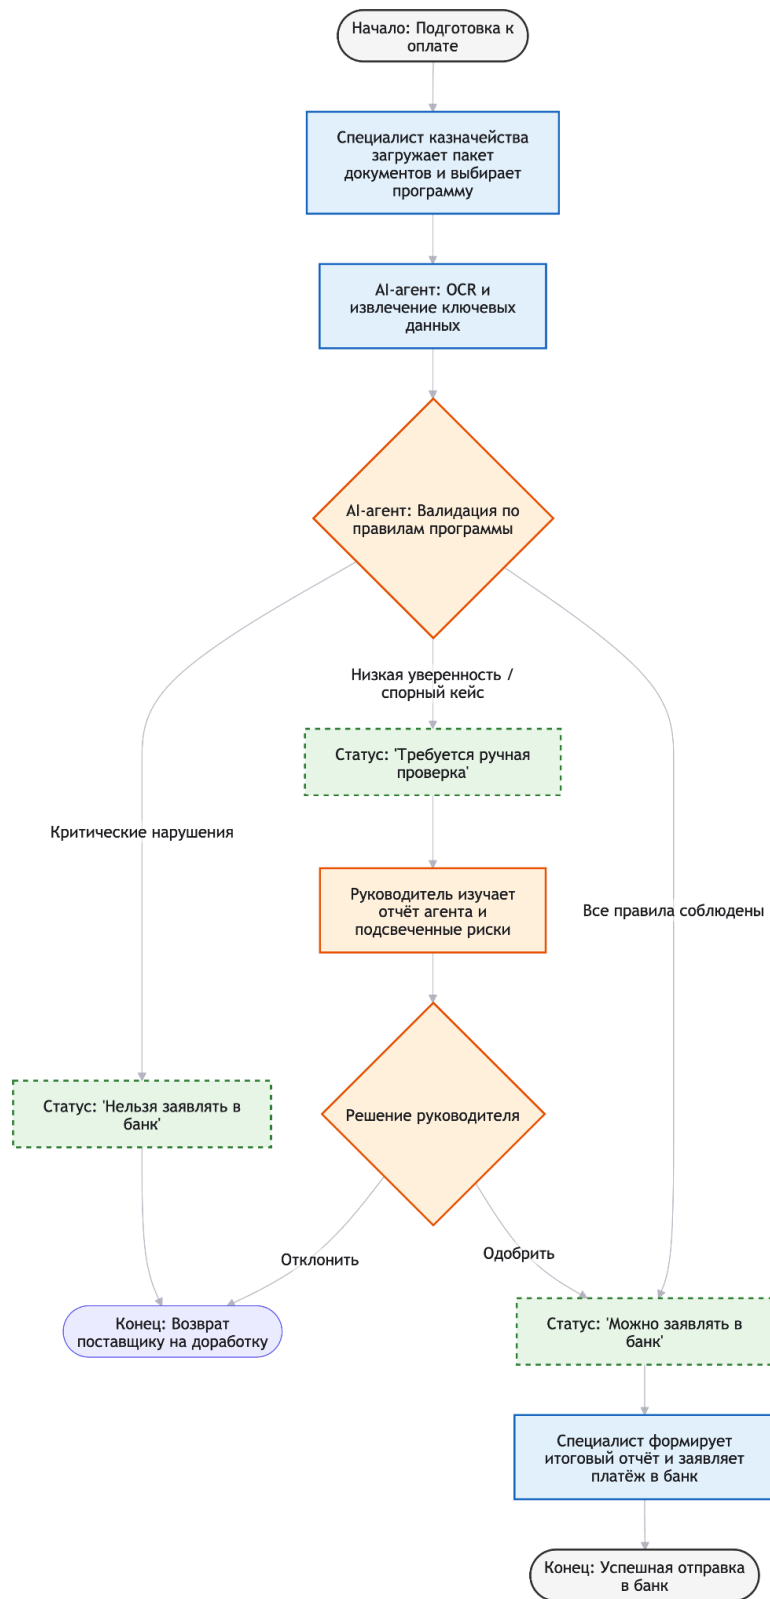

BPMN 2.0 Диаграмма

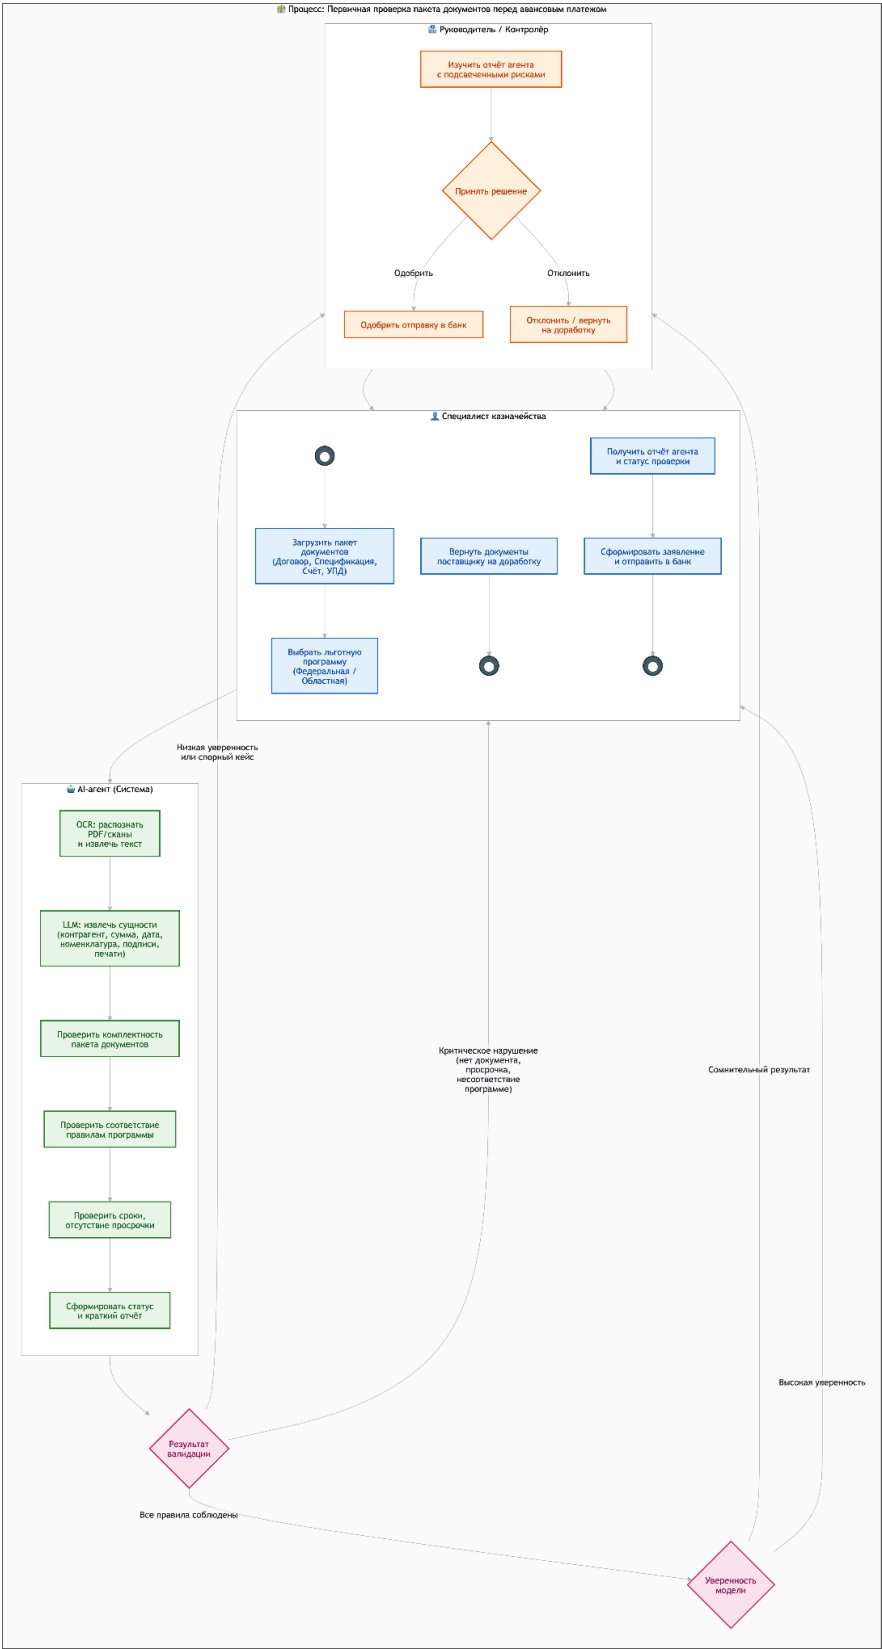

3. Дорожная карта пилота (2 месяца / 8 недель)

Веха	Сроки	Критерии готовности	Вовлеченные роли
1. Сбор требований и Ground Truth	Неделя 1	Подписан устав пилота. Получен размеченный датасет (мин. 50 пакетов: с ошибками и без). Формализованы правила программ.	БА, РМ, Заказчик, Юристы
2. Архитектура и Доступы	Неделя 2	Согласован контур (S3, LLM, БД). Получены доступы к тестовым ресурсам. Утвержден макет UI.	ИТ, СБ, РМ, Dev
3. Разработка ядра (OCR + LLM)	Неделя 3-4	Настроен пайплайн извлечения сущностей. Точность распознавания ключевых полей (сумма, дата) > 90% на тестовой выборке.	Dev, Data Scientist
4. Логика проверок и UI	Неделя 5-6	Реализованы правила валидации. Готов веб-интерфейс загрузки и дашборд руководителя.	Dev, Frontend, БА
5. Калибровка и Внутреннее тестирование	Неделя 7	Агент не пропускает критические ошибки из тестового набора. Настроены промпты для минимизации галлюцинаций.	БА, QA, Dev
6. Пилотная эксплуатация и Приемка	Неделя 8	Пользователи протестировали систему на реальных задачах. Собраны метрики. Подписан акт приемки MVP.	РМ, БА, Заказчик, Казначейство

Ключевые риски и митигация

- Риск: Низкое качество OCR на специфических бухгалтерских документах (плохие сканы, таблицы).
Митигация: Заложить время на промпт-инжиниринг. Ввести статус «Требуется ручная проверка» при низкой confidence score модели, чтобы агент не «угадывал» данные.
- Риск: Срыв сроков из-за блокировок со стороны ИТ-безопасности (выгрузка данных во внешние контуры).
Митигация: Инициировать запрос в СБ на 1-й неделе. Использовать обезличенные данные или локальные open-source модели для пилота, если облака запрещены.

4. Процесс работы с заказчиком и командой

- Daily с командой разработки (15 мин): Фокус на блокерах, технических долгах и статусе задач на текущий спринт.

- Еженедельный статус с Заказчиком (30-45 мин, Пятница): Демо прироста функционала, обсуждение метрик качества (точность/полнота), согласование спорных бизнес-правил.
- Фокус сообщений:
 - *Для команды:* четкие критерии приемки (Acceptance Criteria), приоритет бизнес-логики над красотой UI.
 - *Для заказчика:* прозрачность прогресса, управление ожиданиями (акцент на том, что AI — это ассистент, а не замена человеку в спорных кейсах), быстрая обратная связь по спорным документам.

5. Мотивация участия в проекте

1. Почему мне интересен этот проект?
 Меня привлекает возможность работы на стыке классического бизнес-анализа, управления проектами и современных AI-технологий (LLM, OCR). Проект имеет ярко выраженную практическую пользу: мы не просто «внедряем нейросеть», а решаем реальную боль бизнеса, снижаем операционные риски и освобождаем людей от изнурительной рутины. Работа с такими стейкхолдерами, как Сбер, требует высокого уровня насмотренности и дисциплины, что является отличным вызовом для моего профессионального роста.
2. Как я вижу свою роль в команде, которая создаёт продукт?
 Я вижу себя «мостом» между бизнесом и разработкой. С одной стороны, я буду транслировать сложные юридические и бухгалтерские правила в четкие алгоритмы и промпты, понятные LLM. С другой стороны, я возьму на себя защиту команды от хаотичных изменений скоупа, выстраивая прозрачный процесс приемки и управления ожиданиями заказчика. Моя цель - сделать так, чтобы бизнес получил рабочий инструмент, а команда - понятный бэклог и адекватные критерии качества.
3. Сколько времени в неделю я готова уделять проекту и в течение какого периода?
 Я готова уделять проекту 40 часов в неделю в формате полной занятости на весь срок пилота (2 месяца), а также быть на связи в период подготовки к защите результатов и масштабированию решения. Я понимаю, что пилотные проекты требуют гибкости и быстрого реагирования на обратную связь от заказчика.
