

Шикова Людмила

Тестовое задание для Бизнес Аналитика + Project менеджера


Бизнес-кейс: AI-платформа управления личными подписками и регулярными платежами

Проект: Платформа «Умный реестр подписок» (Backend-ядро и AI-интеграция) для автоматизации учёта, расчёта дат списаний и контроля статуса подписок пользователя

1. Вопросы к заказчику и стейкхолдерам

№	Вопрос	Кому	Зачем задаем	Какой риск закрываем
1	При каком уровне точности распознавания мы можем автоматически создавать обязательство, а когда нужно спросить подтверждение у пользователя?	Заказчик (Елизавета Сафронова)	Чтобы понять границы автоматизации и избежать ошибок	Риск создания ложных обязательств из-за ошибок распознавания
2	Как мы будем работать с персональными данными из писем? Нужно ли их шифровать или обезличивать? Какие требования Сбера к безопасности данных мы должны учесть?	Служба безопасности / Legal	Чтобы соблюсти 152-ФЗ и внутренние стандарты Сбера по безопасности	Риск утечки данных, штрафов и блокировки проекта
3	Что делать, если дата в письме некорректная (например, 31 февраля) или противоречит правилам календаря?	Команда разработки / Заказчик	Чтобы понять, кто отвечает за проверку дат: AI или система	Риск накопления ошибок в расчёте дат платежей
4	Как пользователь сможет исправить ошибку, если AI неправильно распознал сумму или дату? Где он это сделает?	UX / Заказчик	Чтобы собрать обратную связь и улучшить точность распознавания	Риск того, что ошибки AI останутся неисправленными
5	Сколько писем в день мы будем обрабатывать для одного пользователя в тестовом режиме?	Команда разработки / PMO	Чтобы оценить нагрузку на систему и стоимость обработки	Риск превышения лимитов Gmail API и бюджета
6	Что делать, если пользователь отменил подписку в сервисе, но письмо об этом не пришло или было пропущено?	Заказчик / ЦА	Чтобы продумать сценарий «потерянных» обязательств	Риск ложных напоминаний и раздражения пользователя
7	Какие типы сервисов мы будем поддерживать в первой версии (банковские выписки, стриминговые платформы, мобильные операторы, облачные хранилища)?	Заказчик / Команда разработки	Чтобы подготовить тестовые примеры писем и настроить шаблоны распознавания	Риск того, что система не распознает реальные письма от ключевых сервисов
8	Планируется ли интеграция с другими сервисами Сбера (Сбер ID, СберПрайм, СберБанк Онлайн) для автоматического получения данных о подписках?	Заказчик / Архитектор	Чтобы понять, можем ли мы использовать внутренние API Сбера вместо парсинга писем	Риск дублирования функционала с существующими сервисами Сбера
9	Как мы поймём, что подписка больше не используется? По каким признакам?	Заказчик / Аналитик	Чтобы настроить рекомендацию об отмене неиспользуемых подписок	Риск того, что пользователь продолжит платить за ненужное
10	Какие уведомления важнее: за 7 дней, за 3 дня или в день платежа? Можно ли их настраивать?	Заказчик / ЦА	Чтобы определить приоритеты в системе напоминаний	Риск того, что пользователь проигнорирует важные уведомления

2. Бизнес-процесс: Автоматическое извлечение финансового обязательства из письма и добавление в реестр

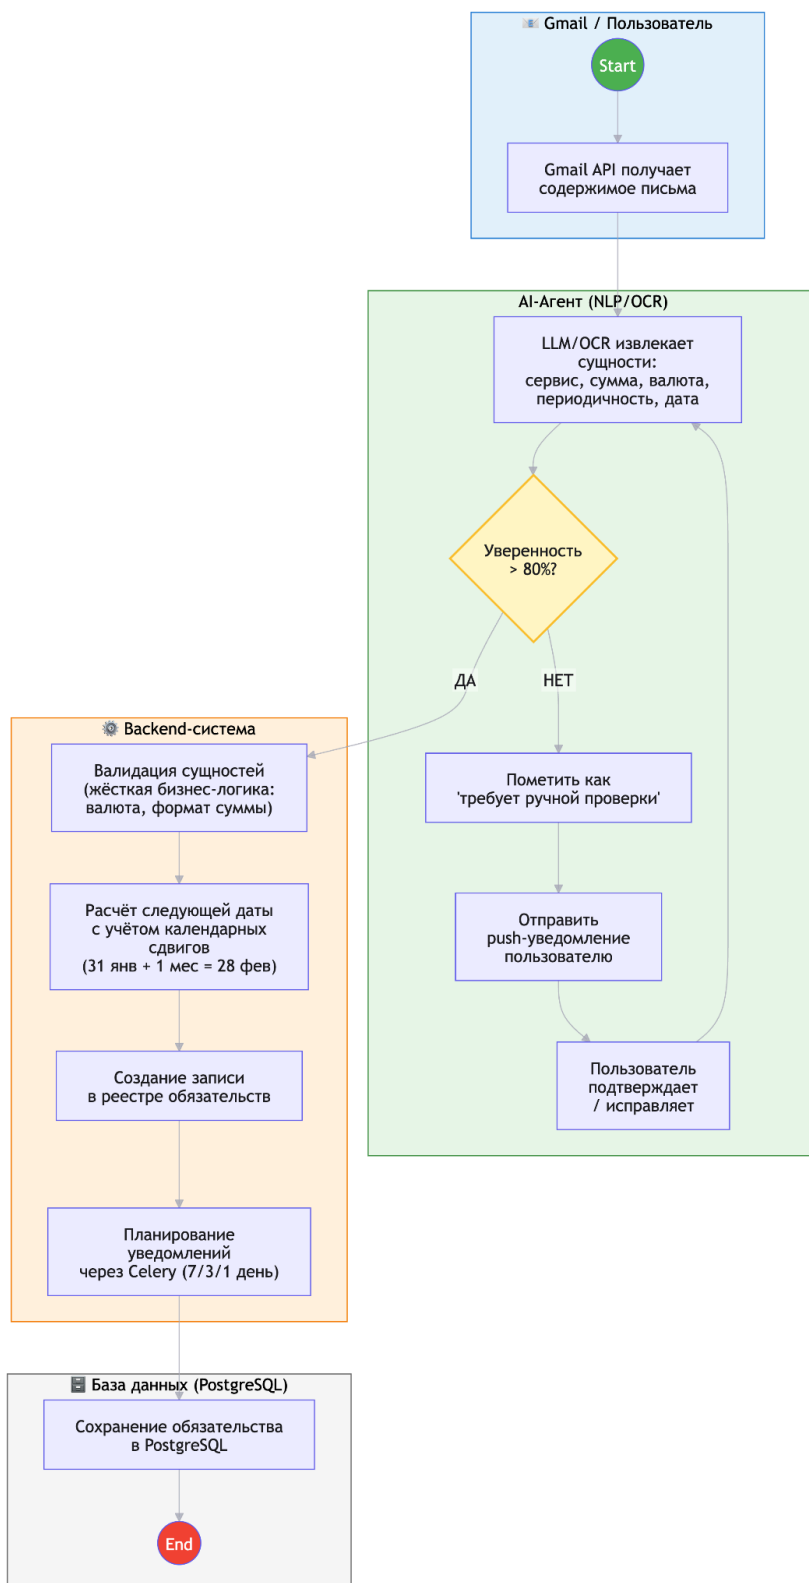

3. Дорожная карта пилота

№	Веха	Срок	Что делаем	Результат	Кто участвует	Риски
1	Подготовка	Недели 1-2	Собираем 50+ тестовых писем Настраиваем Gmail API и окружение Согласовываем требования безопасности	Датасет готов Окружение работает Документ по безопасности согласован	BA/PM, Backend, Security, Data Analyst	Риск: Security долго согласовывает Решение: Готовим обезличенный датасет параллельно
2	AI-модуль	Недели 3-4	Настраиваем OCR для PDF/изображений Пишем промпты для LLM Тестируем точность извлечения	Точность >90% (метрика из ТЗ) API /extract работает Обработка ошибок настроена	Data Scientist, Backend, BA, QA	Риск: LLM ошибается на сложных чеках Решение: Добавляем UI "Подтвердить/Исправить"
3	Backend-ядро	Недели 5-6	Создаём БД PostgreSQL Пишем календарную логику (31 янв → 28 фев) Настраиваем Celery для напоминаний	Реестр работает Даты считаются корректно Напоминания (7/3/1 день) приходят	Backend, DBA, BA, QA	Риск: Celery теряет задачи Решение: Настраиваем Redis + мониторинг
4	Frontend + Интеграция	Неделя 7	Делаем React-интерфейс (календарь, список) Собираем end-to-end сценарий Тестируем на мобильных	Полный сценарий работает UI оптимизирован под мобильные Код в GitLab	Frontend, Backend, QA, UX	Риск: UI не успевает Решение: Сокращаем до минимума (календарь + список)
5	Пилот и сдача	Неделя 8	Тестируем на 5-10 пользователей Замеряем метрики Проводим демо для заказчика	Все 5 условий приемки выполнены Метрики подтверждены Заказчик принял	PM, BA, Вся команда, Заказчик	Риск: Метрики не достигнуты Решение: Закладываем 2-3 дня на фикс багов

4. Процесс работы с заказчиком и командой

Стейкхолдер	Формат	Частота	Фокус сообщения
Заказчик	Демонстрация результатов	Раз в 2 недели	Работающий функционал, бизнес-ценность, метрики
Заказчик	Статус-отчёт	Еженедельно	Выполненные работы, план, риски, метрики
Заказчик	Согласование изменений	По необходимости	Оценка влияния на сроки и бюджет
Руководитель (R&D направления)	Рабочая встреча по AI-модулю	Раз в 2 недели	Точность модели, качество промптов, метрики
Руководитель проектного офиса	Управленческий отчёт	Ежемесячно	Стратегический статус, ресурсы, риски
Команда разработки	Ежедневная статус-встреча	Ежедневно, 15 мин	Блокеры, статус задач, технический долг
Команда разработки	Планирование рабочего цикла	Раз в 2 недели	Формирование задач на период
Команда разработки	Демонстрация результатов	Раз в 2 недели	Показ инкремента продукта
Команда разработки	Ретроспектива	Раз в 2 недели	Анализ процесса и поиск улучшений
Служба безопасности	Согласование требований	По необходимости	Соответствие 152-ФЗ и стандартам Сбера

Мотивация участия в проекте

1. Мне интересен этот проект, потому что он на стыке финансов и новых технологий. У меня большой опыт в бухгалтерии и учёте обязательств, я понимаю, как важно не пропустить сроки платежей и контролировать подписки. Проект решает реальную проблему: люди теряют деньги на забытых подписках и автопродлениях. Мне интересно создать продукт, который поможет пользователям экономить деньги и время. Работа в Сбере - это возможность учиться у лучших и расти в новой для себя профессии бизнес-аналитика.
2. Я вижу себя связующим звеном между заказчиком и разработчиками. Моя задача - понять, что нужно бизнесу и пользователям, и перевести это в чёткие требования для команды. Благодаря опыту в финансах я хорошо понимаю предметную область проекта учёт обязательств, расчёт дат, контроль платежей. Это помогает мне говорить на одном языке и с заказчиком, и с разработчиками. В AI-проектах важно предвидеть ошибки и заранее продумать, как система будет их исправлять.
3. Готова уделять проекту 40 часов в неделю (полная занятость). Это нужно, чтобы глубоко погрузиться в задачу и работать в ритме команды. Рассматриваю участие в течение всей стажировки от 3 до 6 месяцев. Если проект покажет хорошие результаты, готова продолжить сотрудничество.
