

Тестовое задание: Бизнес-аналитик + Project Manager
Проект: Цифровой помощник тьютора с AI-анализом

Кандидат: Шикова Людмила

1. Вопросы к стейкхолдерам

Для снижения неопределенности на старте проекта я составила список из 8 ключевых вопросов. Они направлены на прояснение юридических, технических и пользовательских аспектов.


№	Вопрос	Кому адресован	Зачем задаем (Бизнес-цель)	Какой риск закрываем
1	Каков юридический статус данных (медицинские или педагогические) и есть ли уже готовые шаблоны информированных согласий по Ф3-152?	Заказчик / Юрист	Определить уровень шифрования и требования к хранению данных.	Риск штрафов и блокировки сервиса за нарушение законодательства РФ.
2	Какие именно параметры «сенсорного профиля» и «эмоций» являются критичными для AI? Есть ли утвержденная таксономия терминов?	Ведущий специалист / Методолог	Стандартизировать входные данные для обучения и промптинга GigaChat.	Риск «галлюцинаций» AI из-за разночтений в терминах разных тьюторов.
3	Готовы ли тьюторы тратить более 3-5 минут на ввод данных после каждого блока занятий?	Тьюторы (фокус-группа)	Понять лимит времени на ввод, чтобы спроектировать максимально быстрый UI (чек-листы vs текстовые поля).	Риск саботажа системы персоналом из-за увеличения нагрузки.
4	Требуется ли интеграция с существующими медицинскими картами (МИС) или мы строим изолированную систему?	Врач / IT-директор	Определить необходимость разработки API для внешних систем.	Риск дублирования данных и рассинхронизации диагнозов.
5	Кто имеет финальное право «вето» на AI-подсказку перед тем, как она станет видна родителю?	Специалист / Заказчик	Настроить ролевую модель доступа (RBAC) и логику статусов данных.	Риск передачи родителям непроверенной или тревожной информации.
6	Как мы будем верифицировать точность AI-выводов на этапе пилота?	Data Scientist / BA	Разработать метрики качества (Precision/Recall) для дообучения модели.	Риск потери доверия к продукту из-за нерелевантных рекомендаций.
7	Какой объем исторических данных (Excel/заметки) нужно мигрировать в систему на старте?	Тьюторы / Тех. команда	Оценить трудозатраты на ETL-процессы (Extract, Transform, Load).	Риск потери ценной исторической динамики при переходе на новый сервис.
8	Каковы критерии «красной зоны» (тревоги), при которых система должна отправлять push-уведомление врачу?	Врач / Методолог	Настроить триггеры для экстренного оповещения.	Риск пропуска критического ухудшения состояния ребенка.

2. Описание бизнес-процесса

Выбранный процесс: «Внесение ежедневных наблюдений тьютором и первичная AI-обработка».


Текстовое описание (User Flow)

1. Авторизация: Тьютор входит в мобильное приложение под своим логином. Система проверяет права доступа.
2. Выбор профиля: Тьютор выбирает ребенка из закрепленного списка. Открывается форма «Ежедневное наблюдение».
3. Ввод данных:
 - Тьютор заполняет чек-листы (сон, аппетит, сенсорика) и выбирает значения из выпадающих списков (уровень агрессии, контактность).
 - При необходимости добавляется голосовой комментарий, который транскрибируется в текст.
4. Валидация и Сохранение: Frontend проверяет обязательные поля. Данные отправляются на Backend (Python).
5. Запись в БД:
 - Создается запись в таблице observations.
 - Срабатывает Trigger, который фиксирует факт изменения в таблице аудита person_audit (кто, когда, какие старые/новые данные).
6. AI-Анализ:
 - Backend передает структурированные данные в модуль AI (GigaChat).
 - AI сопоставляет новые данные с историей за последние 14 дней.
 - Формируется инсайт (например: «Замечена связь: снижение сна < 8 часов ведет к росту стереотипий на 20%»).
7. Результат: Инсайт сохраняется в БД со статусом pending_review (ожидает проверки). Тьютор видит предварительную цветовую индикацию статуса дня (Зеленый/Желтый/Красный).

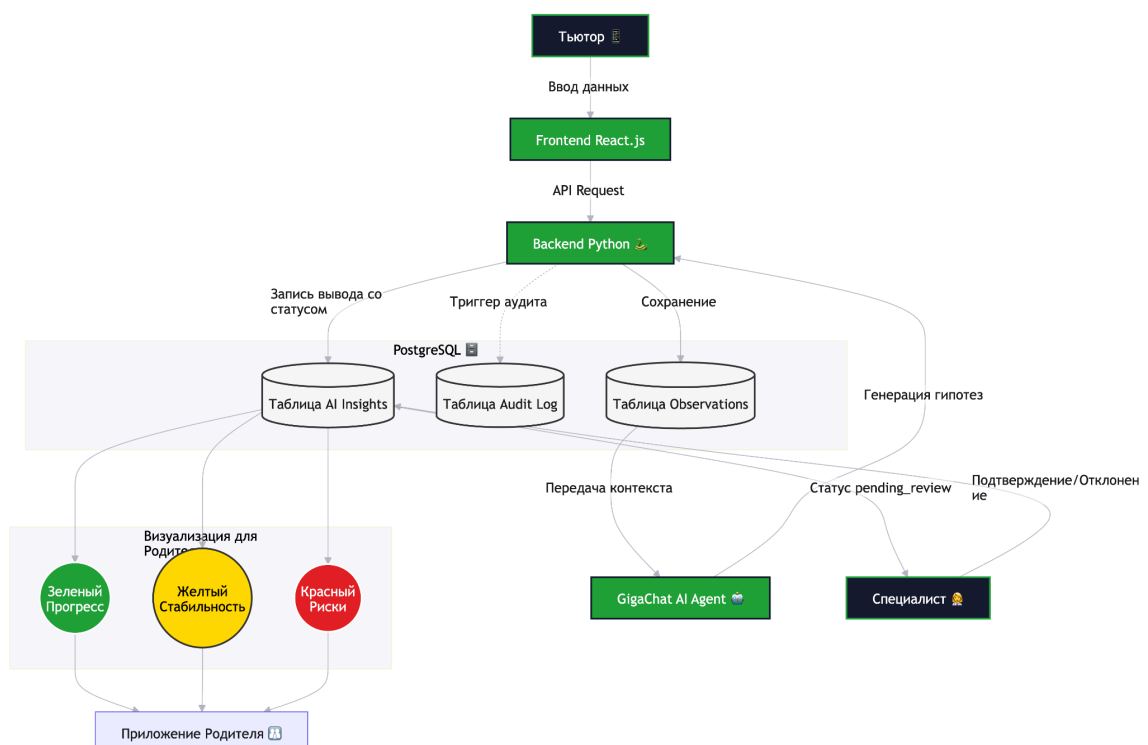

3. Дорожная карта пилота (2 месяца)

План рассчитан на быструю проверку гипотезы (MVP) с участием 5-10 детей.



Веха	Сроки	Критерии готовности (DoD)	Роли	Риски и Митигация
1. Проектирование и Прототип	Недели 1-2	Утвержденный макет Figma, описанная структура БД (ER-диаграмма), готовые промпты для GigaChat.	BA, UX/UI, Tech Lead	Риск: Непонимание тьюторами интерфейса. Митигация: Тестирование прототипа на 2-х тьюторах до начала разработки.
2. Разработка MVP (Core)	Недели 3-5	Работающие личные кабинеты, форма ввода данных, сохранение в PostgreSQL, базовая визуализация графиков.	Frontend, Backend, QA	Риск: Задержки по срокам. Митигация: Использование готовых UI-библиотек (Ant Design/MUI).
3. Интеграция AI и Аудита	Недели 5-6	AI выдает подсказки на основе реальных данных, реализован лог изменений (триггеры БД).	Backend, Data Scientist	Риск: Неточные выводы AI. Митигация: Ручная модерация всех выводов специалистом на первом этапе.
4. Закрытое бета-тестирование	Неделя 7	Система развернута на тестовом сервере, проведено обучение 5 тьюторов, собран первый пакет данных.	PM, BA, Тьюторы	Риск: Баги при вводе данных. Митигация: Выделенный канал связи с разработчиками в Telegram для быстрого фикса.
5. Анализ и Корректировка	Неделя 8	Собрана обратная связь, исправлены критические баги, подготовлен отчет по метрикам (скорость ввода, точность AI).	Вся команда, Заказчик	Риск: Низкая активность пользователей. Митигация: Внедрение геймификации (баллы за регулярность заполнения).

4. Процесс работы с командой и заказчиком

Для обеспечения прозрачности и контроля качества я предлагаю использовать гибридный подход (Scrum + элементы Kanban).

- Формат работы: Спринты по 2 недели. Это позволит регулярно показывать заказчику работающий функционал, а не просто отчеты.
- Коммуникация:
 - Daily Stand-up (15 мин): Синхронизация команды разработки (что сделано, что в работе, какие блокеры).
 - Weekly Demo (1 час): Демонстрация результатов спринта Заказчику и ведущему специалисту. Фокус на том, как работает продукт "в руках" пользователя.
 - Backlog Grooming: Еженедельная приоритизация задач с учетом обратной связи от тьюторов.
- Артефакты:

- Jira/Trello: Для отслеживания статуса задач (To Do, In Progress, Testing, Done).
- Confluence/Notion: Для хранения требований, инструкций для тьюторов и протоколов встреч.
- Контроль качества: Обязательное Code Review и тестирование на реальных устройствах (iOS/Android/Web) перед каждой демонстрацией.

Мотивация участия в проекте

1. Системный подход к помощи:
2. Мой бухгалтерский бэкграунд научил меня тому, что за каждой цифрой стоит реальная история. В этом проекте за каждым параметром (сном, эмоцией) стоит качество жизни ребенка. Я хочу применить свою любовь к порядку и структуре для создания инструмента, который делает эту помощь измеримой и эффективной.
3. Роль моста между мирами: Я вижу свою роль как переводчика с языка «болей родителей и тьюторов» на язык технических требований для разработчиков. Моя задача — убедиться, что сложная архитектура (AI, БД) решает простую человеческую проблему.
4. Готовность к погружению: Я готова уделять проекту 20–25 часов в неделю на протяжении следующих 3–6 месяцев. Для меня это не просто стажировка, а возможность реализовать полноценный продукт с высокой социальной значимостью.
